

自治区 2023 年度预算绩效评价报告

赛文咨字【2024】第 035 号

项目名称：2023 年消防装备购置项目

项目单位：伊吾县应急管理局

主管部门：伊吾县应急管理局

委托单位：伊吾县财政局

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

2024 年 9 月



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

随着哈密市经济社会快速发展，伊吾县工业企业发展较快，生产经营要素大量聚集，传统和非传统风险问题交织叠加，消防工作仍面临严峻挑战。

根据伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目建议书的批复》（伊发改投资[2023]227号）文件，由伊吾县应急管理局（以下称“项目单位”）实施哈密市伊吾县消防装备购置项目（以下称“本项目”、“项目”）。项目批复总投资425.25万元，资金来源均为县财政资金；批复建设期限2023年7月-2023年9月；项目批复建设规模及建设内容为：购置多功能城市主战消防车（国产底盘）、多功能灭火机器人（化工类火灾专用）、灭火无人机（带照明功能）等8大类1593件（套）消防专用器材装备。

本项目经委托咨询单位编制项目概算，伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目投资概算的批复》（伊发改投资[2023]262号），项目正式实施。

（二）项目实施情况

本项目2023年9月在新疆政府采购网发布公开招标公告，2023年10月确定中标单位新疆锦泰祥安全设备有限公司，本项目的消防装备购置中标价378.8388万元，项目于

2023 年 12 月 7 日完成对全部 97 项设备用具第一次验收，其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，其他设备全部验收通过。2024 年 4 月 12 日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。

（三）绩效目标

1. 总目标

为适应消防救援队伍的职能任务，加快推进各类装备转型升级，不断优化装备性能结构和配备体系，全面提升装备实战实用效能，深入贯彻国家关于应急管理工作重要论述和习主席训词精神，坚持“科学配装、质量建装、管理强装、人才兴装”，全面提升装备配备实战化、管理规范化的保障体系化、人才专业化水平。逐步建成与应急救援任务相适应，与消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。

2. 年度绩效目标

项目设定年度绩效目标为：购置多功能城市主战消防车（国产底盘）、多功能灭火机器人（化工类火灾专用）、灭火无人机（带照明功能）等 8 大类 1593 件（套）消防专用器材装备。项目的建设和实施，对提高消防工作能力，保护群众安全效果明显。

项目绩效目标表：

图 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称	消防装备购置项目		
预算单位	伊吾县应急管理局	项目负责人	帕提古丽
项目资金	年度预算总额（万元）：425.25		

(万元)		其中：财政拨款：425.25						
		其他资金：0.00						
年度总体目标								
做好 2023 全消防装备购置工作，提高消防工作及时，保护群众安全。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防装备采购品类	>=8 大类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备采购数量（套）	>=1593 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防装备保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备完成合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防设备购置费	<=414.35 万元	预算支出标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=5.8 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三类费用	<=5.1 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消防工作及时，保护群众安全	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问卷调查等方式，评价小组对消防装备购置项目进行了综合评价。总体上看，该项目取得了很好的成效。按照评价指标体系，经综合评定“消防装备购置项目”绩效得分为 88.22 分，绩效等级为“良好”。

（二）预算执行情况

项目批复预算 425.25 万元，实际到位资金 425.25 万元，资金到位率为 100%；经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 303.37104 万元，预算执行率 71.34%。

（三）项目绩效情况

项目于 2023 年 12 月 7 日完成对 97 项设备、用具第一次验收，其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符要求未确认验收，其他设备全部验收通过。2024 年 4 月 12 日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。项目按可行性研究报告，比照施工计划标准全部完成施工内容，同时参考年度项目自评，结合项目实施后的满意度调查，项目实施效果明显，提高了综合生产能力，促进了多种经营，对区域经济全面发展及加强经济建设都具有重要意义。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

一是，项目实施单位，重点从资金使用范围、用途、审批、拨付程序、时效、资金监管、绩效管理、资产管理、档案管理等方面提出规范要求，同时考虑从常态化和应急救援保障两方面做出规定，做到既优先保障救援时效性，又做到持续提高救援能力，确保有限资金用在“刀刃”上。

二是，实施单位通过政府采购，起到降本增效作用，所采购设备和专用器具验收一批交付一批，提高国有资产使用率和所配置二级单位履职能力。

（二）存在问题与不足

存在的问题一：项目批复实施期间 2023 年 7 月-9 月，

项目全部终验通过时间 2024 年 4 月，延期 7 个月，采购事项未能如期验收。

存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致。

存在的问题三：预算执行率偏低。伊吾县发展和改革委员会 2023 年 7 月批复项目总投资 425.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 303.37104 万元，预算执行率偏低为 71.34%。

（三）建议和改进措施

一是，项目于 2023 年 12 月 7 日完成对 97 项设备用具第一次验收，其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，其他设备全部验收通过。2024 年 4 月 12 日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。

二是，完善制度建设。良好的项目实施和运作工作需要配套建立完善的管理体制和制度，明确管理责任人，以制度为支撑，强化项目开展全过程的科学规范管理意识。实施单位应进一步建立和完善财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度、档案管理制度等。

三是，项目完成终验后，根据伊财字[2024]清欠文件，2024 年 6 月 12 日安排支付了后续款项 75.76776 元，项目累计支付 379.1388 万元，对照批复总投资 425.25 万元，预算执行率为 89.16%；对照项目合同总额 379.1388 万元（其中消防装备采购合同价 378.8388 万元，设计概算编制费用 0.3

万元），总体预算执行率达到 100%。

主 评 人：黄智儒

黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024 年 9 月



目 录

摘 要	1
一、基本情况	9
(一) 项目概况。	9
(二) 项目绩效目标。	12
二、绩效评价工作开展情况	13
(一) 绩效评价目的、对象和范围。	13
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。	14
(三) 绩效评价工作过程。	19
三、综合评价情况及评价结论	21
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况。	21
(二) 项目过程情况。	24
(三) 项目产出情况。	26
(四) 项目效益情况。	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29
(一) 主要经验及做法。	29
(二) 存在的问题及原因分析。	29
六、相关建议	30
七、其他需要说明的问题	31
八、绩效评价结果应用建议	31
附件：1. 消防装备购置项目绩效评价指标体系评分表 ...	33

附件： 2. 满意度调查问卷分析报告	40
附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表	54

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，紧紧围绕推进消防治理体系和治理能力现代化，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，加强公共消防设施、消防装备和消防组织建设，创新社会消防安全管理，完善应急救援机制体制，全面提升防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平，坚决防范遏制重特大火灾事故，全面提升火灾防控水平和灭火救援能力。

始终坚持“预防为主、防消结合”的方针，不断强化消防安全责任制，加快城乡公共消防基础设施建设，深入开展火灾隐患排查整治，不断优化消防车辆装备结构，对标“主力军、国家队”和“全灾种、大应急”职能定位，稳步提升灭火救援实战能力，广泛开展社会消防宣传教育培训，扎实推进消防安全工作和消防救援队伍改革发展，不断提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力和水平，为全市社会稳定和长治久安提供了坚实的消防安全保障。

加强党的领导为消防救援事业发展提供根本保证。习近平总书记提出的对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民

“四句话方针”，为消防救援队伍改革发展提供了科学指南和根本遵循。党中央、国务院坚持以人民为中心的发展思想，为防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故指明了前进方向。

随着哈密市经济社会快速发展，伊吾县工业企业发展较快，生产经营要素大量聚集，传统和非传统风险问题交织叠加，消防工作仍面临严峻挑战。

根据伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目建议书的批复》（伊发改投资[2023]227号）文件，由伊吾县应急管理局（以下称“项目单位”）实施哈密市伊吾县消防装备购置项目（以下称“本项目”、“项目”）。项目批复总投资425.25万元，资金来源均为县财政资金；批复建设期限2023年7月-2023年9月；项目批复建设规模及建设内容为：购置多功能城市主战消防车（国产底盘）、多功能灭火机器人（化工类火灾专用）、灭火无人机（带照明功能）等8大类1593件（套）消防专用器材装备。

本项目经委托咨询单位编制项目概算，伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目投资概算的批复》（伊发改投资[2023]262号），项目正式实施。

2. 主要内容及实施情况

根据伊吾县发展和改革委员会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目建议书的批复》（伊发改投资

[2023]227号)文件,由伊吾县应急管理局(以下称“项目单位”)实施本项目。项目批复总投资425.25万元,资金来源均为县财政资金;批复建设期限2023年7月-2023年9月。

项目批复建设内容为:购置多功能城市主战消防车(国产底盘)、多功能灭火机器人(化工类火灾专用)、灭火无人机(带照明功能)等8大类1593件(套)消防专用器材装备。

本项目经委托咨询单位编制可行性研究报告及初步设计,伊吾县发展和改革委员会会下达《关于哈密市伊吾县消防装备购置项目投资概算的批复》(伊发改投资[2023]262号),项目正式开始实施。

本项目2023年9月4日在新疆政府采购网发布公开招标公告,因有效投标供应商不足,9月25日发布废标公告;9月27日重新发布公开招标公告,2023年10月18日发布中标公告,拟选单位新疆锦泰祥安全设备有限公司,中标价378.8388万元,经公示期未收到质疑,双方于10月18日签订采购合同。项目于2023年12月7日完成对全部97项消防装备第一次验收,其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收,其余消防装备全部验收通过。2024年4月12日,对多功能城市主战消防车二次验收通过。

3. 资金投入和使用情况

消防装备购置项目批复预算总投资425.25万元,2023年实际到位资金425.25万元,资金到位率为100%;经核查平台指标和财务支出凭证,实际支出303.37104万元,预算

执行率 71.34%。项目资金按照项目资金相关管理规定使用，项目的实际支出与规定用途相符，财务支出凭证符合相关财务管理规定。

4. 项目组织与管理情况

为保证本项目顺利实施，伊吾县应急管理局通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目采购、接收、支付等各项工作，组织和协调有关部门对采购项目进行验收工作，对项目执行及资金使用情况进行检查、监督，督促有关部门拨付建设资金，对项目采购成果组织验收和评价。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

为适应消防救援队伍的职能任务，加快推进各类装备转型升级，不断优化装备性能结构和配备体系，全面提升装备实战实用效能，深入贯彻国家关于应急管理工作重要论述和习主席训词精神，坚持“科学配装、质量建装、管理强装、人才兴装”，全面提升装备配备实战化、管理规范化的保障体系化、人才专业化水平。逐步建成与应急救援任务相适应，与消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。

2. 年度绩效目标

项目设定年度绩效目标为：购置多功能城市主战消防车（国产底盘）、多功能灭火机器人（化工类火灾专用）、灭火无人机（带照明功能）等 8 大类 1593 件（套）消防专用

器材装备。项目的建设和实施，对提高消防工作能力，保护群众安全效果明显。

项目绩效目标表：

图 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称		消防装备购置项目						
预算单位		伊吾县应急管理局			项目负责人		帕提古丽	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：425.25						
		其中：财政拨款：425.25						
		其他资金：0.00						
年度总体目标								
做好 2023 全消防装备购置工作，提高消防工作及时，保护群众安全。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防装备采购品类	>=8 大类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备采购数量（套）	>=1593 件	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防装备保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防装备完成合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防设备购置费	<=414.35 万元	预算支出标准	-	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=5.8 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		三类费用	<=5.1 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消防工作及时，保护群众安全	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥99%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

本次评价的目的旨在通过购买社会服务独立、客观、公正地核查哈密市伊吾县消防装备购置项目资金的申报、使用和绩效目标的实现情况，分析资金使用中存在的问题及原因，在此基础上提出改进和加强项目资金使用的意见和建议，从而进一步提高资金管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善支出项目绩效管理提供参考。

2. 绩效评价对象和范围

评价对象和范围是：伊吾县应急管理局 2023 年实施的哈密市伊吾县消防装备购置项目及其所涉及的财政预算资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）客观独立原则。制定实施方案中明确了伊吾县财政局、赛文公司、伊吾县应急管理局三方的权利和责任，严格执行利益冲突和回避制度，确保实施绩效评价的客观性和独立性。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）一致可靠原则。评价标准具有一定范围适用性，不能区别对待或随意变动，保证评价可以达到必要的可信度。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行

评价，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

2. 评价依据

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

(2) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

(3) 《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）

(4) 《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）

(5) 《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）

(6) 《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）

(7) 《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕193号）

(8) 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（预算司〔2021〕6号）

(9) 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）

(10) 《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）

(11) 《关于参照使用预算绩效评价指标体系的通知》
（自治区财政绩效评价中心）

(12)《重点项目绩效评价操作指引》(自治区财政绩效评价中心)

3. 评价指标体系(附表说明)

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,以“完善体系运用、突出绩效导向”的评价思路,在与项目实施单位沟通的基础上不断研究完善,制定了绩效评价指标体系。

指标体系项目决策、实施过程、项目产出和项目效益4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标和39个评分点,对项目政策制定、投入、产出、效果和影响进行全面的评价。

评价指标体系在指标和权重设置上参考了财政部发布的《预算绩效评价共性指标体系框架》、《财政资金使用绩效评价指标(共性)》、《预算绩效评价指标体系1.0》,并且结合了项目现场评价时与项目实施单位沟通及收集的资料分析。指标体系评分设计宗旨是“轻形式重应用、轻汇报重核查”,以便更客观准确地反映被评价项目的绩效情况,评价指标详见附件1。

4. 评价方法

评价组通过单位自评、实地考察、座谈问询、对照查证和复核等多种方式,主要采用重要事件法、指标分析法、因素分析法、公众评议法,运用定性指标与定量指标结合、静态指标与动态指标结合、点上调查与面上分析结合的分析手段,确保评价结果客观、准确。具体如下:

(1) 重要事件法

是对本项目实施绩效评价的基本方法,涉及评价内容一

是审查项目实施方案和批复程序相关材料，从而对项目立项充分性和规范性进行评价；二是审查项目绩效目标表，从而对项目绩效目标的合理性和明确性进行评价；三是审查可行性研究报告和批复、控制造价书等对预算指标的确定，从而对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。

通过审查，项目建议书、设计概算和对应批复文件齐备完整，审批程序规范，绩效目标基本设置科学合理。

（2）指标分析法

要求实施单位提供的目标表指标作为参照指标，涉及评价内容一是审查指标到位和执行财务原始凭证，从而对资金到位率、执行率、规范性进行评价；二是审查项目实施单位内控相关财务管理制度、项目管理制度等关键性制度，从而对组织实施的制度保障和有效性进行评价；三是审查资金支付明细、工程进度款项、财政直接支付凭证、合同等原件，从而对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行评价。

通过审查，相关手续和佐证材料齐全完整，财务凭证真实合法、审批程序规范科学、执行落实有效。

（3）因素分析法

要求实施单位提供项目自评、总结、现场照片等相关文字图像资料，结合第三方实地调研和电话调查，对实施效益进行评价。涉及评价内容一是审查自评、总结等材料，从而对项目实施整体情况作初步了解；二是审查项目施工过程资料，印证实施效果。从而对产生的社会效益、可持续影响方

面进行评价；三是通过满意度调查及座谈等，从而对产生的社会效益、可持续影响方面进行评价。

通过审查，自评总结等材料相对齐全，项目实施了全过程财政绩效工作，通过实施方案、验收材料、现场调研、问卷走访、面谈，完工后实际效益达到计划标准。

（4）公众评议法

通过伊吾县应急管理局安排非项目实施人员的其他人员，对伊吾县应急管理局项目实施人员、伊吾县消防救援大队消防装备使用人员，开展满意度调查，结合项目绩效评价组对实施单位、财政部门相关工作人员等面谈，从而对整体满意度进行评价。

通过审查，所惠及工作人员整体满意度较高，对项目实施效果普遍认可。

5. 评价标准

结合《自治区财政厅重点项目支出绩效评价报告专家评审打分表》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档，分别是：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90, 80]、中等（80, 70]、差（得分 < 70 分）。

表 2-1 项目评价结果评分评级表

评价得分	评价等级
90分（含）-100分	优秀
80分（含）-90分（不含）	良好
70分（含）-80分（不含）	中等
70分以下	差

有效的绩效评价标准遵循原则是：标准是基于工作而非工作者、标准是可以达到的、标准是为人所知的、标准是经过协商而制定的、标准有时间的限制、标准必须有意义、标

准是可以改变的。

按照以上原则，制定的评价标准有计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等做为评价标准。

（2）行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准

指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下，应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门等确认或认可的其他标准。

针对本项目，主要采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

项目评价小组成员：

项目总审：黄智儒 注册会计师、注册税务师、
高级会计师

项目主评人：周宏军 注册会计师、注册税务师
高级会计师

项目经理：王立冈

项目组成员：屈伟 绩效评价师
杨玉玲

（1）制定评价方案（2024年7月5日-7月8日）

评价机构指派专人与伊吾县财政局及项目实施单位沟通，在全面调研和了解被评价项目相关情况和委托方评价意

图的基础上，根据财政部门对实施绩效评价的基本规定，按照赛文公司单位内部项目实施和管理办法工作要求，拟定了科学可行的绩效评价实施方案，并提交由“主评人”为组长的内部评审小组评议通过，与委托方沟通确认后开展下一步工作。

（2）现场组织实施（2024年7月9日-7月31日）

根据绩效评价实施方案，由评价机构项目实施单位发项目评价函，评价组工作人员开展现场调查和资料收集整理工作，对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（3）撰写评价报告初稿（2024年8月1日-8月20日）

在根据现场调研的基础上，工作人员将项目情况和佐证材料提交评审小组，逐项分析印证资料，结合书面初评和现场评价的结果对项目进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见。

（4）评价报告征求意见（2024年8月21日-8月31日）

将初步评价结论反馈给委托方和资金使用单位征求意见，并根据意见对评价报告进行评议。由评价机构对反馈意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告进行修改。评价机构指定了专人负责修改后的评价报告内审，审核通过后提交评审小组终审确

定。

(6) 出具评价报告（2024 年 9 月 1 日-9 月 10 日）

主评人签名并加评价机构印章后，形成正式评价报告后，提交项目单位及委托单位，同时按要求上传财政部“绩效评价第三方机构信用管理平台”备案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问卷调查等方式，评价小组对哈密市伊吾县消防装备购置项目进行了综合评价。总体上看，该项目取得了较好的成效。综合评定哈密市伊吾县消防装备购置项目”绩效得分为 88.22 分，绩效等级为“良好”。其中：项目决策类指标权重 20 分，得分 20 分，得分率为 100%；过程类指标权重 20 分，得分 17.39 分，得分率 86.95%；产出类指标权重 30 分，得分 20.83 分，得分率 69.43%；效益类指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

表 3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值比重
1. 决策	20	20	100%
2. 管理	20	17.39	86.95%
3. 产出	30	20.83	69.43%
4. 效果	30	30	100%
综合绩效	100	88.22	88.22%

评价指标体系评分表见附件 1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标 6 个三级指标构成，权重分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。各项指标业绩

值和得分情况如下表所示：

表 4-1 项目决策情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	充分	4.0	4.0	100%
		立项程序规范性	规范	规范	3.0	3.0	100%
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	不完全合理	4.0	4.0	100%
		绩效指标明确性	明确	不明确	3.0	3.0	100%
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	科学	4.0	4.0	100%
		资金分配合理性	合理	合理	2.0	2.0	100%
合计					20.0	20.0	100%

1. 项目立项指标得分分析

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。党中央、国务院坚持以人民为中心的发展思想，未防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故指明了前进方向，习近平总书记提出的“四句话方针”，为消防救援队伍改革发展提供了科学指南和根本遵循。

“十四五”时期是哈密市巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键时期，消防救援事业发展改革将迎来历史性机遇。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。

根据《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）、《新疆维吾尔自治区消防救援事业发展“十四五”规划（稿）》、《关于推进消防救援事业高质量发展的意见》、《消防救援

队伍应急装备物资保障体系建设纲要》、《新疆消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》、《新疆消防救援总队应急装备物资储备规划（2021年-2023年）》、各类专业队建设标准等法规政策,该项目符合行业发展规划和政策要求。

项目立项与部门职责范围相符,根据辖区具体灾害类型特点及经济规模条件在达标的基础上合理地对本辖区消防救援站进行建设,属于部门履职所需。

根据项目批复文件和政府采购申请批示,本项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。

项目由伊吾县应急管理局负责实施采购,并交付伊吾县消防救援大队使用,与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

（2）立项程序规范性。经核查,该项目已按相关要求办理政府采购申请并获批,已取得伊吾县发展和改革委员会对项目建议书和项目概算批复,程序合规;通过公开招标采购并做公示,采购过程材料齐全完备;本项目为部门单位履职和实际需求确定实施项目,不涉及可行性论证和专家评审,不涉及事前绩效评估。

2. 绩效目标指标得分分析

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值7分,评价得分7分,得分率100%。

（1）绩效目标合理性。经核查,该项目有绩效目标;项目预期产出效益和效果符合正常水平;项目绩效目标按照

采购申请内容和县发改部门批复文件设定，与实际工作内容相关；预算确定的项目投资额或资金量与项目指标总量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目绩效目标表将项目建设内容细化分解为具体的绩效指标，核心指标的产出指标按批复内容设定；项目所设定绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，设定3级指标10条，定量指标9条；项目绩效指标明确，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入指标得分分析

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。经核查，项目委托新疆德坤工程项目管理有限公司编制项目概算并取得县发改部门批复，经过初步设计和概算测算；项目批复文件和预算安排情况，预算内容与项目内容相匹配；经核查项目初步设计，项目概算定额依据现行定额、清单计价规范及特种行业标准、GB50500-2013计价规范等文件测算，概算设定依据充分；项目建议书及概算及其对应批复材料，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。经核查，预算资金按照批复和项目实际资金需求进行分配；项目资金通过大平台下达指标，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标由2个二级指标5个三级指标构成，权

重分值 20 分，评价得分 17.39 分，得分率 86.95%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-2 项目过程情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	100%	3.0	3.0	100%
		预算执行率	100%	71.34%	3.0	2.14	71.33%
		资金使用合规性	合规	合规	4.0	4.0	100%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全、完善	健全、不完善	4.0	2.25	56.25%
		制度执行有效性	有效	有效	6.0	6.0	100%
合计					20.0	17.39	86.95%

1. 资金管理指标得分分析

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 10 分，得分 9.14 分，得分率 91.4%。

(1) 资金到位率。经核查，项目批复预算 425.25 万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金 425.25 万元，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率。经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 303.37104 万元，预算执行率 71.34%，根据评分标准扣 0.86 分。

(3) 资金使用合规性。经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理方法和财务管理制度的有关规定；经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；经核查项目档案及原始凭证，资金使用符合项目合同规定的用途；经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施指标得分分析

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。

（1）管理制度健全性。经核查单位内控制度，项目实施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同、档案等相关管理制度。经核查单位内控制度，已建立的管理制度中财务管理制度未明确分级授权、财务档案等相关内容，业务管理制度中采购限额标准未明确，合同签审程序不规范；资产管理制度不完整，对清查、处置、调拨等程序未明确。根据评分细则扣 1.75 分。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，开展项目招标采购、签订合同、实施验收等工作；经核查项目批复，项目采购内容按批复执行，不涉及采购事项变更；经核查项目资料，项目招标资料、采购合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标 4 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 20.83 分，得分率 69.43%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-3 项目产出情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率	100%	98.97%	8.0	7.92	99%
	产出质量 (8 分)	质量达标率	100%	98.97%	8.0	7.92	99%
	产出时效 (7 分)	完成及时率	100%	0.0%	7.0	0.0	0.0%
	产出成本	成本完成率	<=100%	71.34%	7.0	4.99	71.29%

	(7分)						
合计					30.0	20.83	69.43%

1. 产出数量指标得分分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。经核查，项目于2023年12月7日完成对97项设备用具第一次验收，其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，其他设备全部验收通过。2024年4月12日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。按截至2023年12月31日验收情况，实际完成率为 $(96/97)*100\%=98.97\%$ ，根据评分指标细则，扣0.08分。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

指标1“消防装备采购品类”指标，预期指标值为大于等于8大类；实际完成指标值为8大类，指标完成率为100%；

指标2“消防装备采购数量（套）”指标，预期指标值为大于等于1593件；实际完成指标值为1593件，指标完成率为100%；

该指标权重得分8分，评价得分7.92分，得分率99%。

2. 产出质量指标得分分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。同产出数量指标的评分过程，截至2023年底的质量达标率认定为98.97%，扣0.08分。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

质量指标1“消防装备保障率”预期指标值100%，实际完成100%，指标完成率100%；

质量指标 2 “消防装备完成合格率” 预期指标值 100%，实际完成 98.97%，指标完成率 98.97%；

该指标权重得分 8 分，评价得分 7.92 分，得分率 99%。

3. 产出时效指标得分分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划完成时间的比较。经核查，项目批复实施期间 2023 年 7 月-9 月，项目全部终验通过时间 2024 年 4 月，延期 7 个月，根据评分标准计算完成及时率为 0%，根据评分标准，扣 7 分。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

时效指标 1 “资金支付及时率” 预期指标值 100%，实际完成 71.34%，指标完成率 71.34%；

该指标权重得分 7 分，评价得分 0 分，得分率 0%。

4. 产出成本指标得分分析

该指标主要考察成本完成率，即完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。项目批复预算 425.25 万元，全年实际支出 303.37104 万元。项目未按期验收，得 4.99 分。

该指标权重分 7 分，评价得分 4.99 分，得分率 71.29%。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由 2 个二级指标 2 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-4 项目效益情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
------	------	------	-----	-----	----	----	-----

效益 (30分)	实施效益 (20分)	社会效益 (20分)	有效提 高	有效提 高	20.0	20.0	100%
	满意度 (10分)	受益群众满 意度(10分)	≥90%	97.4%	10.0	10.0	100%
合计					30.0	30.0	100%

1. 实施效益指标得分分析

该指标主要考察项目实施产生的效益。项目比照项目建议书采购计划内容全部完成，同时参考年度项目自评，结合项目实施后的满意度调查，项目实施效果明显，提高了消防工作能力，保障了群众安全。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

社会效益指标1“提高消防工作能力，保障群众安全”预期指标值有效提高，实际完成有效提高，指标完成率100%；该指标权重得分20分，评价得分20分，得分率100%。

2. 满意度指标得分分析

调查对象对本项目的满意程度普遍给予肯定。共发放满意度问卷25份，回收问卷20份，有效问卷20份，总体满意度得分为97.4分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位等实施访谈和电话调查结果，综合评定满意度率97.4%。

该指标权重得分10分，评价得分10分，得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是，项目实施单位，重点从资金使用范围、用途、审批、拨付程序、时效、资金监管、绩效管理、资产管理、档案管理等方面提出规范要求，同时考虑从常态化和应急救援保障两方面做出规定，做到既优先保障救援时效性，又做到

持续提高救援能力，确保有限资金用在“刀刃”上。

二是，实施单位通过政府采购，起到降本增效作用，所采购设备和专用器具验收一批交付一批，提高国有资产使用率和所配置二级单位履职能力。

（二）存在的问题及原因分析。

存在的问题一：项目批复实施期间 2023 年 7 月-9 月，项目全部终验通过时间 2024 年 4 月，延期 7 个月，采购事项未能如期验收。

原因分析：其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，造成整体终验时间延迟。

存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致。

原因分析：基层项目单位人员不足，专业能力有限，内控管理意识相对欠缺。

存在的问题三：预算执行率偏低。伊吾县发展和改革委员会 2023 年 7 月批复项目总投资 425.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 303.37104 万元，预算执行率偏低为 71.34%。

原因分析：一是中标合同价低于概算价；二是其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，延期整改调试后，二次验收通过，按合同约定对应款项不符合支付条件。

六、相关建议

一是，针对项目未按期完成验收问题，项目单位督促供应商加快调试和整改，并于 2024 年 4 月 12 日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。

二是，完善制度建设。良好的项目实施和运作工作需要配套建立完善的管理体制和制度，明确管理责任人，以制度为支撑，强化项目开展全过程的科学规范管理意识。实施单位应进一步建立和完善财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度、档案管理制度等。

三是，针对预算执行率偏低问题，项目单位在完成终验后，根据伊财字[2024]清欠文件，2024年 6 月 12 日安排支付了后续款项 75.76776 元，项目累计支付 379.1388 万元，对照批复总投资 425.25 万元，预算执行率为 89.16%；对照项目合同总额 379.1388 万元（其中消防装备采购合同价 378.8388 万元，设计概算编制费用 0.3 万元），总体预算执行率达到 100%。

七、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。

八、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编

制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

本项目绩效评价结果为“良好”，建议根据政策制度，结合伊吾县委、县政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

主评人：黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024年9月

附件：1. 绩效评价指标体系评分表

附件：2. 满意度调查问卷分析报告

附件：3. 绩效评价报告意见反馈表

附件：1. 消防装备购置项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	评分规则	评分过程	业绩值	得分	得分率
决策（20分）	项目立项(7分)	立项依据充分性（4分）	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	符合	计划标准	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合得1分，不符合得0分。	党中央、国务院坚持以人民为中心的发展思想，未防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故指明了前进方向，习近平总书记提出的“四句话方针”，为消防救援队伍改革发展提供了科学指南和根本遵循。“十四五”时期是哈密市巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键时期，消防救援事业发展改革将迎来历史性机遇。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。	符合	1	100%
			1	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	符合	计划标准	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，符合得1分，不符合得0分。	根据《城市消防站建设标准》（建标152-2017）、《新疆维吾尔自治区消防救援事业发展“十四五”规划（稿）》、《关于推进消防救援事业高质量发展的意见》、《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》、《新疆消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》、《新疆消防救援总队应急装备物资储备规划（2021年-2023年）》、各类专业队建设标准等法规政策，该项目符合行业发展规划和政策要求，得1	符合	1	100%

						分。				
		1	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需	相符	计划标准	项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需,符合得1分,不符合得0分。	项目立项与部门职责范围相符,根据辖区具体灾害类型特点及经济规模条件在达标的基础上合理地对本辖区消防救援站进行建设,属于部门履职所需,得1分。	相符	1	100%
		0.5	项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	符合	计划标准	项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则,符合得0.5分,不符合得0分。	根据项目批复文件和政府采购申请批示,本项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得0.5分。	符合	0.5	100%
		0.5	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不重复	计划标准	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复,不重复得0.5分,不符合得0分。	项目由伊吾县应急管理局负责实施采购,并交付伊吾县消防救援大队使用,与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复,得0.5分。	不重复	0.5	100%
	立项程序规范性(3分)	1	项目是否按照规定的程序开展前期工作并取得审批	是	计划标准	项目是否按照规定的程序开展前期工作并取得审批,是得1分,不是得0分。	经核查,该项目已按相关要求办理政府采购申请并获批,已取得伊吾县发展和改革委员会对项目建议书和项目概算批复,程序合规,得1分。	是	1	100%
		1	招投标文件、材料是否符合相关要求	符合	计划标准	招投标文件(如有)、采购材料是否符合相关要求,符合得1分,不符合得0分。	经核查,通过公开招标采购并做公示,采购过程材料齐全完备,得1分。	符合	1	100%
		1	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	是	计划标准	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,是得1分,不是得0分。	本项目为部门单位履职和实际需求确定实施项目,不涉及可行性论证和专家评审,不涉及事前绩效评估,得1分。	是	1	100%

绩效目标(7分)	绩效目标合理性(4分)	1	项目是否有绩效目标	有	计划标准	项目是否有绩效目标,有得1分,没有得0分。	经核查,该项目有绩效目标,得1分。	有	1	100%
		1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	相关	计划标准	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,相关得1分,每有一项不相关扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目绩效目标按照采购申请内容和县发改部门批复文件设定,与实际工作内容相关,得1分。	相关	1	100%
		1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	符合	计划标准	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,符合得1分,每有一项不符合扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分。	符合	1	100%
		1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	匹配	计划标准	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,匹配得1分,不匹配得0分。	经核查,项目初设确定的项目投资额或资金量相匹配与预算相匹配,得1分。	匹配	1	100%
	绩效指标明确性(3分)	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是	计划标准	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,有得1分,每有一项不符合扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目绩效目标表将项目建设内容细化分解为具体的绩效指标,核心指标的产出指标按批复内容设定,得1分。	是	1	100%
		1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是	计划标准	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,相关得1分,每有一项不是扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目所设定绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,设定3级指标10条,定量指标9条,得1分。	是	1	100%
		1	是否与项目目标任务数或计划数相对应	相对应	计划标准	是否与项目目标任务数或计划数相对应,符合得1分,每有一项不符合扣0.5分,扣完为止。	经核查,项目绩效指标明确,与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	相对应	1	100%
	资金投入(6分)	1	预算编制是否经过科学论证	是	计划标准	预算编制是否经过科学论证,是得1分,不是得0分。	项目委托新疆德坤工程项目管理有限公司编制项目概算并取得县发改部门批复,经过初步设计和概算测算,得1	是	1	100%

								分。			
			1	预算内容与项目内容是否匹配	匹配	计划标准	预算内容与项目内容是否匹配,匹配得 1 分,不匹配得 0 分。	经核查,项目批复文件和预算安排情况,预算内容与项目内容相匹配,得 1 分。	匹配	1	100%
			1	预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制	是	计划标准	预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是得 1 分,不是得 0 分。	经核查项目初步设计,项目概算定额依据现行定额、清单计价规范及特种行业标准、GB50500-2013 计价规范等文件测算,概算设定依据充分,得 1 分。	是	1	100%
			1	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	匹配	计划标准	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,匹配得 1 分,不匹配得 0 分。	经核查项目建议书及概算及其对应批复材料,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得 1 分。	匹配	1	100%
		资金分配合理性(2分)	1	预算资金分配依据是否充分	充分	计划标准	预算资金分配依据是否充分,充分得 1 分,不充分得 0 分。	经核查,预算资金按照批复和项目实际资金需求进行分配,得 1 分。	充分	1	100%
			1	资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应	是	计划标准	资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应,适应得 1 分,不完全适应得 0.6 分,不适应得 0 分。	经核查,项目资金通过大平台下达指标,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,得 1 分。	是	1	100%
过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率(3分)	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	100%	计划标准	资金到位率达 100%得满分,每下降 1%扣除权重分的 1%,低于 60%,得 0 分。	经核查,项目批复预算 425.25 万元,项目资金通过大平台下达指标,实际到位资金 425.25 万元,资金到位率为 100%。	100%	3	100%
		预算执行率(3分)	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	100%	计划标准	预算执行率达 100%得满分,每下降 1%扣除权重分的 1%,低于 60%,得 0 分。	经核查平台指标和财务支出凭证,实际支出 303.37104 万元,预算执行率 71.34%,扣 0.86 分。	71.34%	2.14	71.33%

	资金使用 合规性（4 分）	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合	计划标准	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理办法和财务管理制度的有关规定，得1分。	符合	1	100%
		1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	有	计划标准	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，有得1分，每有一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分。	有	1	100%
		1	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合	计划标准	是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金使用符合项目合同规定的用途，得1分。	符合	1	100%
		1	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	计划标准	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否得1分，是得0分。	经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	否	1	100%
	组织实 施（10 分）	2	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	已制定	计划标准	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，已制定得2分，每有一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查单位内控制度，项目实施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同、档案等相关管理制度，得2分。	健全	2	100%
		2	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	是	计划标准	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得2分，每有一项不是扣0.25分，扣完为止。	经核查单位内控制度，已建立的管理制度中财务管理制度未明确分级授权、财务档案等相关内容，业务管理制度中采购限额标准未明确，合同签审程序不规范；资产管理制度不完整，对清查、处置、调拨等程序未明确。扣1.75分。	不完整	0.25	12.5%
		1	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是	计划标准	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得1分，不是得0分。	在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，开展项目招标采购、签订合同、实施验收等工	是	1	100%

								作，得 1 分。			
			1	项目调整及支出调整手续是否完备	完备	计划标准	项目调整及支出调整手续是否完备，完备得 1 分，不完备得 0 分。	经核查项目批复，项目采购内容按批复执行，不涉及采购事项变更，得 1 分。	不涉及	1	100%
			2	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	计划标准	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，是得 2 分，每有一项不是扣 0.25 分，扣完为止。	经核查项目资料，项目招标资料、采购合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得 2 分。	是	2	100%
			2	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	是	计划标准	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得 2 分，每有一项不是扣 0.25 分，扣完为止。	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 2 分。	是	2	100%
产出（30分）	产出数量(8分)	实际完成率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	100%	计划标准	1. 实际完成率达 100%得满分；2. 未达到的按完成率计分；3. 实际完成率超出 20%及以内的不扣分，超出 20%及以上的按实际完成率=[2-(实际产出数/计划产出数)]/计划产出数，计算得分；4. 实际完成率达到或超过 200%的，得 0 分。	经核查，项目于 2023 年 12 月 7 日完成对 97 项设备用具第一次验收，其中一辆多功能城市主战消防车技术参数不符合要求未确认验收，其他设备全部验收通过。2024 年 4 月 12 日，对多功能城市主战消防车二次验收通过。按 截至 2023 年 12 月 31 日验收情况，实际完成率为（96/97）*100%=98.97%，根据评分指标细则，扣 0.08 分。	98.97%	7.92	99%
	产出质量(8分)	质量达标率	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	100%	计划标准	质量达标率达 100%得满分；未达到的，按完成率计分。	同产出数量指标的评分过程， 截至 2023 年底的质量达标率认定为 98.97%，扣 0.08 分。	98.97%	7.92	99%

	产出时效(7分)	完成及时率	7	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致	100%	计划标准	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致,提前完工时间在 20%以内的不扣分,逾期完工的根据时间进度计算完成及时率,进行扣分,扣完为止。	经核查,项目批复实施期间 2023 年 7 月-9 月,项目全部终验通过时间 2024 年 4 月,延期 7 个月,根据评分标准计算完成及时率为 0%,根据评分标准,扣 7 分。	0%	0	0%
	产出成本(7分)	成本完成率	7	项目是否超预算、成本是否节约	<=100%	计划标准	1. 项目超预算的,得 0 分; 2. 项目完工验收并实现成本节约的不扣分; 3. 项目未完工的,按成本完成率=(实际支出/计划支出)*100%,计算得分。	项目批复预算 425.25 万元,全年实际支出 303.37104 万元。项目未按期验收,扣 2.01 分。	71.34%	4.99	71.29%
效益 (30分)	实施效益 (20分)	社会效益 (20分)	20	提高消防工作能力,保障群众安全	有效提高	计划标准	效果明显得权重分的 90%-100%,具有效果得权重分的 60%-89%,效果不明显得权重分的 0%-59%,没有效果不得分。	对照采购申请及上级单位对行业的中长期发展规划,比照采购批复全部完成采购内容,同时参考年度项目自评,结合项目实施后的满意度调查,项目实施效果明显,满足了伊吾县消防救援大队火灾扑救和抢险救援工作需要,提高了消防工作能力和保障群众安全效果,得 20 分。	有效提高	20	100%
	满意度 (10分)	受益群众满意度 (10分)	10	受益职工对项目实施的满意程度	>=90%	计划标准	调查对象满意度达 90%得满分,每下降 1%,扣除权重的 2%,满意率低于 60%,得 0 分。	对项目实施调查问卷,从封闭式结果以指标分析法、和开放式结果以因素法,结合项目自评及满意度整体打分,综合衡量满意率 97.4%,得分 10 分。	97.4%	10	100%
合计			100	/	/	/	/	/	/	88.22	88.22%

附件：2. 满意度调查问卷分析报告

消防装备购置项目满意度调查问卷分析报告

一、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象是哈密市伊吾县消防装备购置项目实施单位和配置单位人员等。

（二）调研内容

调查对象对哈密市伊吾县消防装备购置项目的评价。

（三）调研方法

在调查目标人群内，随机开展问卷调查，具体问卷见问卷设计。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（四）抽样方式

消防装备购置项目绩效评价满意度调查采取分层不等概率随机抽样法。首先对调查对象进行分层，将对象分为实施单位项目相关人员、所属二级单位的装备使用人员，再对两层人员进行随机抽样。设计问卷总计 25 份。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

二、问卷设计

消防装备购置项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：_____ 电话：_____

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☐消防救援大队设备装备使用人员 ☐应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力，对此您了解吗？（单选）

☐了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力，对人民群众生命和财产安全重要程度如何？

（单选）

☐非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位？（单选）

☐是 ☐否 ☐不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备？（单选）

☐是 ☐否 ☐不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位，项目实施效率性，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？
（单选）

☐已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，
您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，
您打多少分？

_____分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月，对调查对象进行问卷的发放与回收。


（二）问卷回收情况

共发放满意度问卷 25 份，回收问卷 20 份，有效问卷 20 份，总体满意度得分为 97.4 分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位等实施访谈和电话调查结果，综合评定满意度率 97.4%。

四、调查结果分析

根据问卷统计结果，对问卷情况分析如下：

满意度问题由 14 项指标构成，其中 13 项封闭式问题，1 项开放式问题；其中 10 项指标参与满意度计算，指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“满意”、“基本满意”和“不满意”；满分为 100 分，各档次对应的分值为 100 分、80 分、50 分和 0 分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，受访对象的满意度分析结果为 97.4 分。

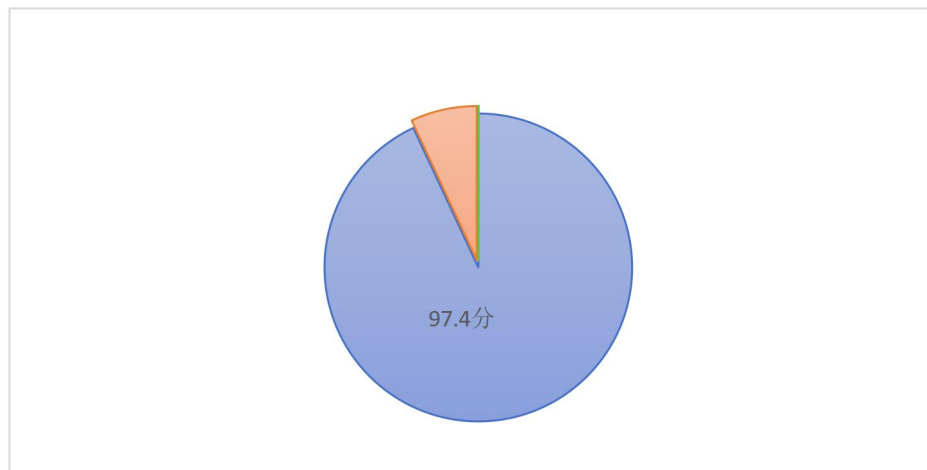

五、满意度调查问卷（篇幅有限，仅展示部分）

消防装备购置项目满意度调查问卷

（2024 年 7 月）

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名： 胡江坤 电话： 19990253987

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 消防救援大队设备装备使用人员 ☐ 应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力，对人民群众生命和财产安全重要程度如何？

（单选）

☐ 非常重要 ☒ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选）

☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位？（单选）

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备？（单选）

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位，项目实施效率性，您的评价是？（单选）

☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？
（单选）

☒已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，
您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，
您打多少分？

98 分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

消防装备购置项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：阿西丁 电话：1360664210

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒消防救援大队设备装备使用人员 ☐应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力，对此您了解吗？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力，对人民群众生命和财产安全重要程度如何？

（单选）

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位？（单选）

☒是 ☐否 ☐不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备？（单选）

☐是 ☒否 ☐不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位，项目实施效率性，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？

（单选）

☒已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，

您的评价是？（单选）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，您打多少分？

95 分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

消防装备购置项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名： 电话：

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 消防救援大队设备装备使用人员 ☐ 应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力，对人民群众生命和财产安全重要程度如何？

（单选）

☐ 非常重要 ☒ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单选）

☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位？（单选）

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备？（单选）

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位，项目实施效率性，您的评价是？（单选）

☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？

（单选）

☒已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，您打多少分？

90分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

消防装备购置项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好, 首先感谢您对本次调查的支持!

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的, 主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度, 不涉及任何商业用途, 在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟, 选项无对错, 希望您按照个人感受作答, 再次感谢您的支持配合!

姓名: 李兴/李 电话: 1816038353

一、基本信息

1. 您的身份是? (单选, 非以下人员不能填写本问卷调查)

☒消防救援大队设备装备使用人员 ☐应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力, 对此您了解吗? (单选)

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力, 对人民群众生命和财产安全重要程度如何?

(单选)

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中, 财政资金到位及时性、支出效率性, 您的评价是? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位? (单选)

☒是 ☐否 ☐不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备? (单选)

☐是 ☒否 ☐不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位, 项目实施效率性, 您的评价是? (单选)

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？
（单选）

☒已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，
您的评价是？（单选）

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，
您打多少分？

88分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？



（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

消防装备购置项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县应急管理局消防装备购置项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和配置单位满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名： 李学军 电话： 12399511571

一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 消防救援大队设备装备使用人员 ☐ 应急管理局参与本项目人员

2. 本项目旨在提升火灾扑救和抢险救援能力，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得火灾和抢险救援能力，对人民群众生命和财产安全重要程度如何？

（单选）

☒ 非常重要 ☐ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

二、满意度评价

4. 项目实施过程中，财政资金到位及时性、支出效率性，您的评价是？（单

选）

☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

5. 购置装备、设备是否配备到位？（单选）

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不清楚

6. 大队是否存在长期闲置不使用的装备、车辆或设备？（单选）

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不清楚

7. 从项目申报到采购和配备到位，项目实施效率性，您的评价是？（单选）

☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

8. 您对供货商相应及时、服务能力、技术指导的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

9. 本项目购置配备装备设备的功能情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 本项目购置配备装备设备的质量情况，您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

11. 使用单位是否建立装备和设备使用、管理、维护、操作等制度或细则？
（单选）

☒已建立、完善 ☐已建立、不完善 ☐未建立 ☐不清楚

12. 装备设备配备前后对比，对于我县火灾扑救和抢险救援能力提升情况，
您的评价是？（单选）

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对于本项目采购项目过程和效果的了解情况，满分 100 分的话，
您打多少分？

97 分（请注明）

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表

附件： 3. 绩效评价报告意见反馈表

绩效评价意见反馈表			
项目名称	哈密市伊吾县消防装备购置项目		
所属年度	2023 年	绩效评价时间	2024 年 7 月-9 月
委托机构	伊吾县财政局		
评价机构	新疆赛文市场调查咨询有限公司		
评价机构联系人	王立冈	联系方式	13629948860
评价结论	绩效得分为 88.22 分，绩效等级为“良好”		
主要问题	存在的问题一：项目批复实施期间 2023 年 7 月-9 月，项目全部终验通过时间 2024 年 4 月，延期 7 个月，采购事项未能如期验收。 存在的问题二：项目单位内控制度建设不完善、不健全，财务管理制度、合同管理制度、采购管理制度等内容单薄不细致。 存在的问题三：预算执行率偏低。伊吾县发展和改革委员会 2023 年 7 月批复项目总投资 425.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 303.37104 万元，预算执行率偏低为 71.34%。		
被评价项目单位意见	同意并采纳其它意见和建议 曹永良 伊吾县应急管理局 2024 年 8 月 9 日		
委托方意见	同意， 伊吾县财政局 2024 年 9 月 9 日		
